Enemærke & Petersen a/s

Aftalt Hovedtidsplan d. 27.11.2024

Fysisk udprintsstørrelse: A3
Bilag 2

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver	Ressourcenavne
1	**Hovedtidsplan AAB Afdeling 17**	**872 dage**	**ma 02-12-24**	**ti 04-04-28**		
2	**Udførelsesprojekting, Skema B/kontrakt ubetinget, Mobilicering**	**215 dage**	**ma 02-12-24**	**ma 29-09-25**		
21	**Keplersgade 5**	**184 dage**	**ma 09-06-25**	**on 18-02-26**		
22	Udførselsperiode for arbejder for opgang	184 dage	ma 09-06-25	on 18-02-26	17	Slut maj efter mob
23	**Afleveringsprocedure**	**69 dage**	**ma 17-11-25**	**to 19-02-26**		
29	Genhusningsprocedure	104 dage	ti 30-09-25	to 19-02-26		
30	Syn og klargøring af boliger der benyttes til genhusning	21 dage	ti 30-09-25	ti 28-10-25		AAB Driftsleder
31	Midlertidige kontrakter fraflytter KG5	0 dage	fr 31-10-25	fr 31-10-25		Beboer
32	Flytning fra bolig til genhusningsbolig.	6 dage	on 29-10-25	on 05-11-25	30	Mesterflyt
33	Genhusnings periode (E&P har adgang til boligen)	77 dage	to 06-11-25	to 19-02-26	22AS-76 dage	E&P
34	**Keplersgade 3**	**184 dage**	**fr 18-07-25**	**ti 31-03-26**	**22SS+10 dage**	
35	Udførselsperiode for arbejder for opgang	184 dage	fr 18-07-25	ti 31-03-26		
36	**Afleveringsprocedure**	**30 dage**	**on 18-02-26**	**on 01-04-26**		
42	Genhusningsprocedure	133 dage	ti 30-09-25	on 01-04-26		
43	Syn og klargøring af boliger der benyttes til genhusning	50 dage	ti 30-09-25	ma 08-12-25		AAB Driftsleder
44	Midlertidige kontrakter fraflytter KG3 (2TV+4TH)	0 dage	sø 14-12-25	sø 14-12-25		Beboer
45	Flytning fra bolig til genhusningsbolig.	6 dage	ti 09-12-25	ma 15-12-25	43	Mesterflyt
46	Genhusnings periode (E&P har adgang til boligen)	77 dage	ti 16-12-25	on 01-04-26	35AS-76 dage	E&P
47	**Keplersgade 1, TH + Tyco Brahes Allé 12, TV**	**127 dage**	**fr 24-10-25**	**fr 17-04-26**	**35SS+70 dage**	
48	Udførselsperiode for arbejder for opgang	127 dage	fr 24-10-25	fr 17-04-26		
49	**Afleveringsprocedure**	**30 dage**	**ma 09-03-26**	**ma 20-04-26**		
55	Genhusningsprocedure	146 dage	ti 30-09-25	ma 20-04-26		
56	Syn og klargøring af boliger der benyttes til genhusning	9 dage	ti 30-09-25	fr 10-10-25		AAB Driftsleder
57	Midlertidige kontrakter fraflytter KG1 og TBA12	0 dage	ti 14-10-25	ti 14-10-25		Beboer
58	Flytning fra bolig til genhusningsbolig.	8 dage	ma 13-10-25	on 22-10-25	56	Mesterflyt
59	Genhusnings periode (E&P har adgang til boligen)	129 dage	to 23-10-25	ma 20-04-26	48SS-1 dag	E&P
60	**Keplersgade 1, TV + Tyco Brahes Allé 12, TH**	**127 dage**	**fr 24-10-25**	**fr 17-04-26**	**48SS**	
61	Udførselsperiode for arbejder for opgang	127 dage	fr 24-10-25	fr 17-04-26		
62	**Afleveringsprocedure**	**30 dage**	**ma 09-03-26**	**ma 20-04-26**		
68	Genhusningsprocedure	146 dage	ti 30-09-25	ma 20-04-26		
69	Syn og klargøring af boliger der benyttes til genhusning	9 dage	ti 30-09-25	fr 10-10-25		AAB Driftsleder
70	Midlertidige kontrakter fraflytter KG1 og TBA12	0 dage	ti 14-10-25	ti 14-10-25		Beboer
71	Flytning fra bolig til genhusningsbolig.	8 dage	ma 13-10-25	on 22-10-25	69	Mesterflyt
72	Genhusnings periode (E&P har adgang til boligen)	129 dage	to 23-10-25	ma 20-04-26	61SS-1 dag	E&P
73	**Tyco Brahes Allé 14**	**184 dage**	**on 17-12-25**	**ma 31-08-26**	**22AS-46 dage**	
75	**Afleveringsprocedure**	**30 dage**	**ti 21-07-26**	**ti 01-09-26**		
81	Genhusningsprocedure	75 dage	ma 18-05-26	fr 28-08-26		
84	**Tyco Brahes Allé 16**	**184 dage**	**to 19-02-26**	**ti 03-11-26**	**22**	
86	**Afleveringsprocedure**	**30 dage**	**on 23-09-26**	**on 04-11-26**		
92	Genhusningsprocedure	75 dage	ti 21-07-26	ma 02-11-26		
95	**Tyco Brahes Allé 18**	**184 dage**	**ma 02-02-26**	**to 15-10-26**	**85AS-210 dage**	
97	**Afleveringsprocedure**	**29 dage**	**fr 04-09-26**	**to 15-10-26**		
103	Genhusningsprocedure	75 dage	to 02-07-26	on 14-10-26		
106	**Tyco Brahes Allé 20**	**184 dage**	**to 02-04-26**	**ti 15-12-26**	**35**	
108	**Afleveringsprocedure**	**29 dage**	**on 04-11-26**	**ti 15-12-26**		
114	Genhusningsprocedure	75 dage	ti 01-09-26	ma 14-12-26		
117	**Tyco Brahes Allé 22, TH + Kirkegårdsvej 46, TV**	**127 dage**	**on 04-11-26**	**to 29-04-27**	**85**	
119	**Afleveringsprocedure**	**30 dage**	**fr 19-03-27**	**fr 30-04-27**		
125	Genhusningsprocedure	127 dage	ti 03-11-26	on 28-04-27		
128	**Tyco Brahes Allé 22, TV + Kirkegårdsvej 46, TH**	**127 dage**	**on 04-11-26**	**to 29-04-27**	**118SS**	
130	**Afleveringsprocedure**	**30 dage**	**fr 19-03-27**	**fr 30-04-27**		
136	Genhusningsprocedure	127 dage	ti 03-11-26	on 28-04-27		
139	**Kirkegårdsvej 48**	**184 dage**	**fr 16-10-26**	**on 30-06-27**	**96**	
141	**Afleveringsprocedure**	**29 dage**	**to 20-05-27**	**on 30-06-27**		
147	Genhusningsprocedure	75 dage	on 17-03-27	ti 29-06-27		
150	**Kirkegårdsvej 50**	**184 dage**	**on 11-11-26**	**ma 26-07-27**	**140SS+15 dage**	
152	**Afleveringsprocedure**	**29 dage**	**ti 15-06-27**	**ma 26-07-27**		
158	Genhusningsprocedure	75 dage	ma 12-04-27	fr 23-07-27		
161	**Kirkegårdsvej 52**	**184 dage**	**on 23-12-26**	**ma 06-09-27**	**151SS+30 dage**	
163	**Afleveringsprocedure**	**29 dage**	**ti 27-07-27**	**ma 06-09-27**		
169	Genhusningsprocedure	75 dage	ma 24-05-27	fr 03-09-27		
172	**Kirkegårdsvej 54**	**184 dage**	**on 03-02-27**	**ma 18-10-27**	**162SS+30 dage**	
174	**Afleveringsprocedure**	**29 dage**	**ti 07-09-27**	**ma 18-10-27**		
180	Genhusningsprocedure	75 dage	ma 05-07-27	fr 15-10-27		
183	**Kirkegårdsvej 56, TH + Højdevej 19, TV**	**127 dage**	**ma 06-09-27**	**ti 29-02-28**	**151AS+15 dage**	
185	**Afleveringsprocedure**	**29 dage**	**on 19-01-28**	**ti 29-02-28**		
191	Genhusningsprocedure	127 dage	fr 03-09-27	ma 28-02-28		
194	**Kirkegårdsvej 56, TV + Højdevej 19, TH**	**127 dage**	**ma 06-09-27**	**ti 29-02-28**	**184SS**	
196	**Afleveringsprocedure**	**29 dage**	**on 19-01-28**	**ti 29-02-28**		
202	Genhusningsprocedure	127 dage	fr 03-09-27	ma 28-02-28		
205	**Gårdprojekt**	**125 dage**	**on 13-10-27**	**ti 04-04-28**		

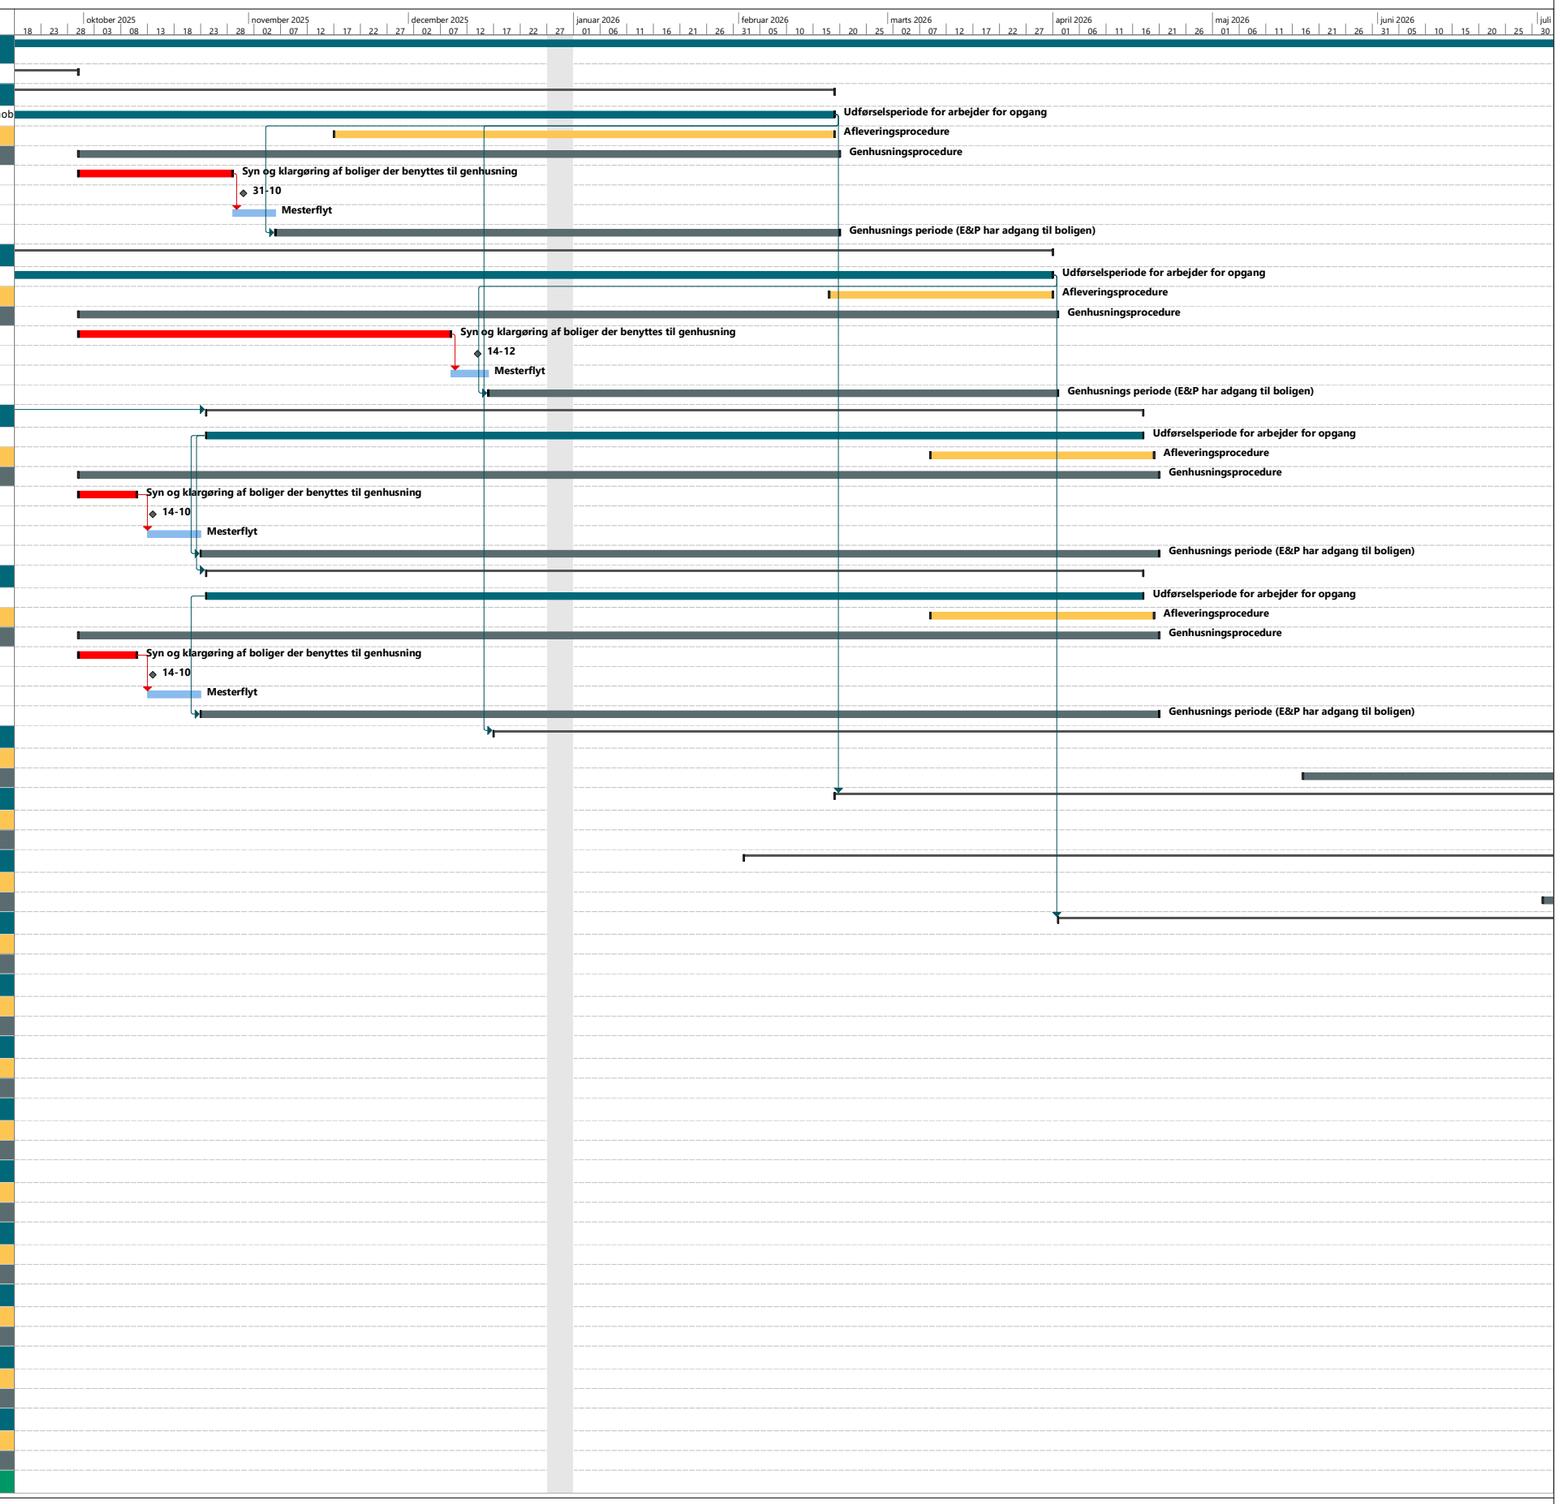

Enemærke & Petersen a/s

Aftalt Hovedtidsplan d. 27.11.2024
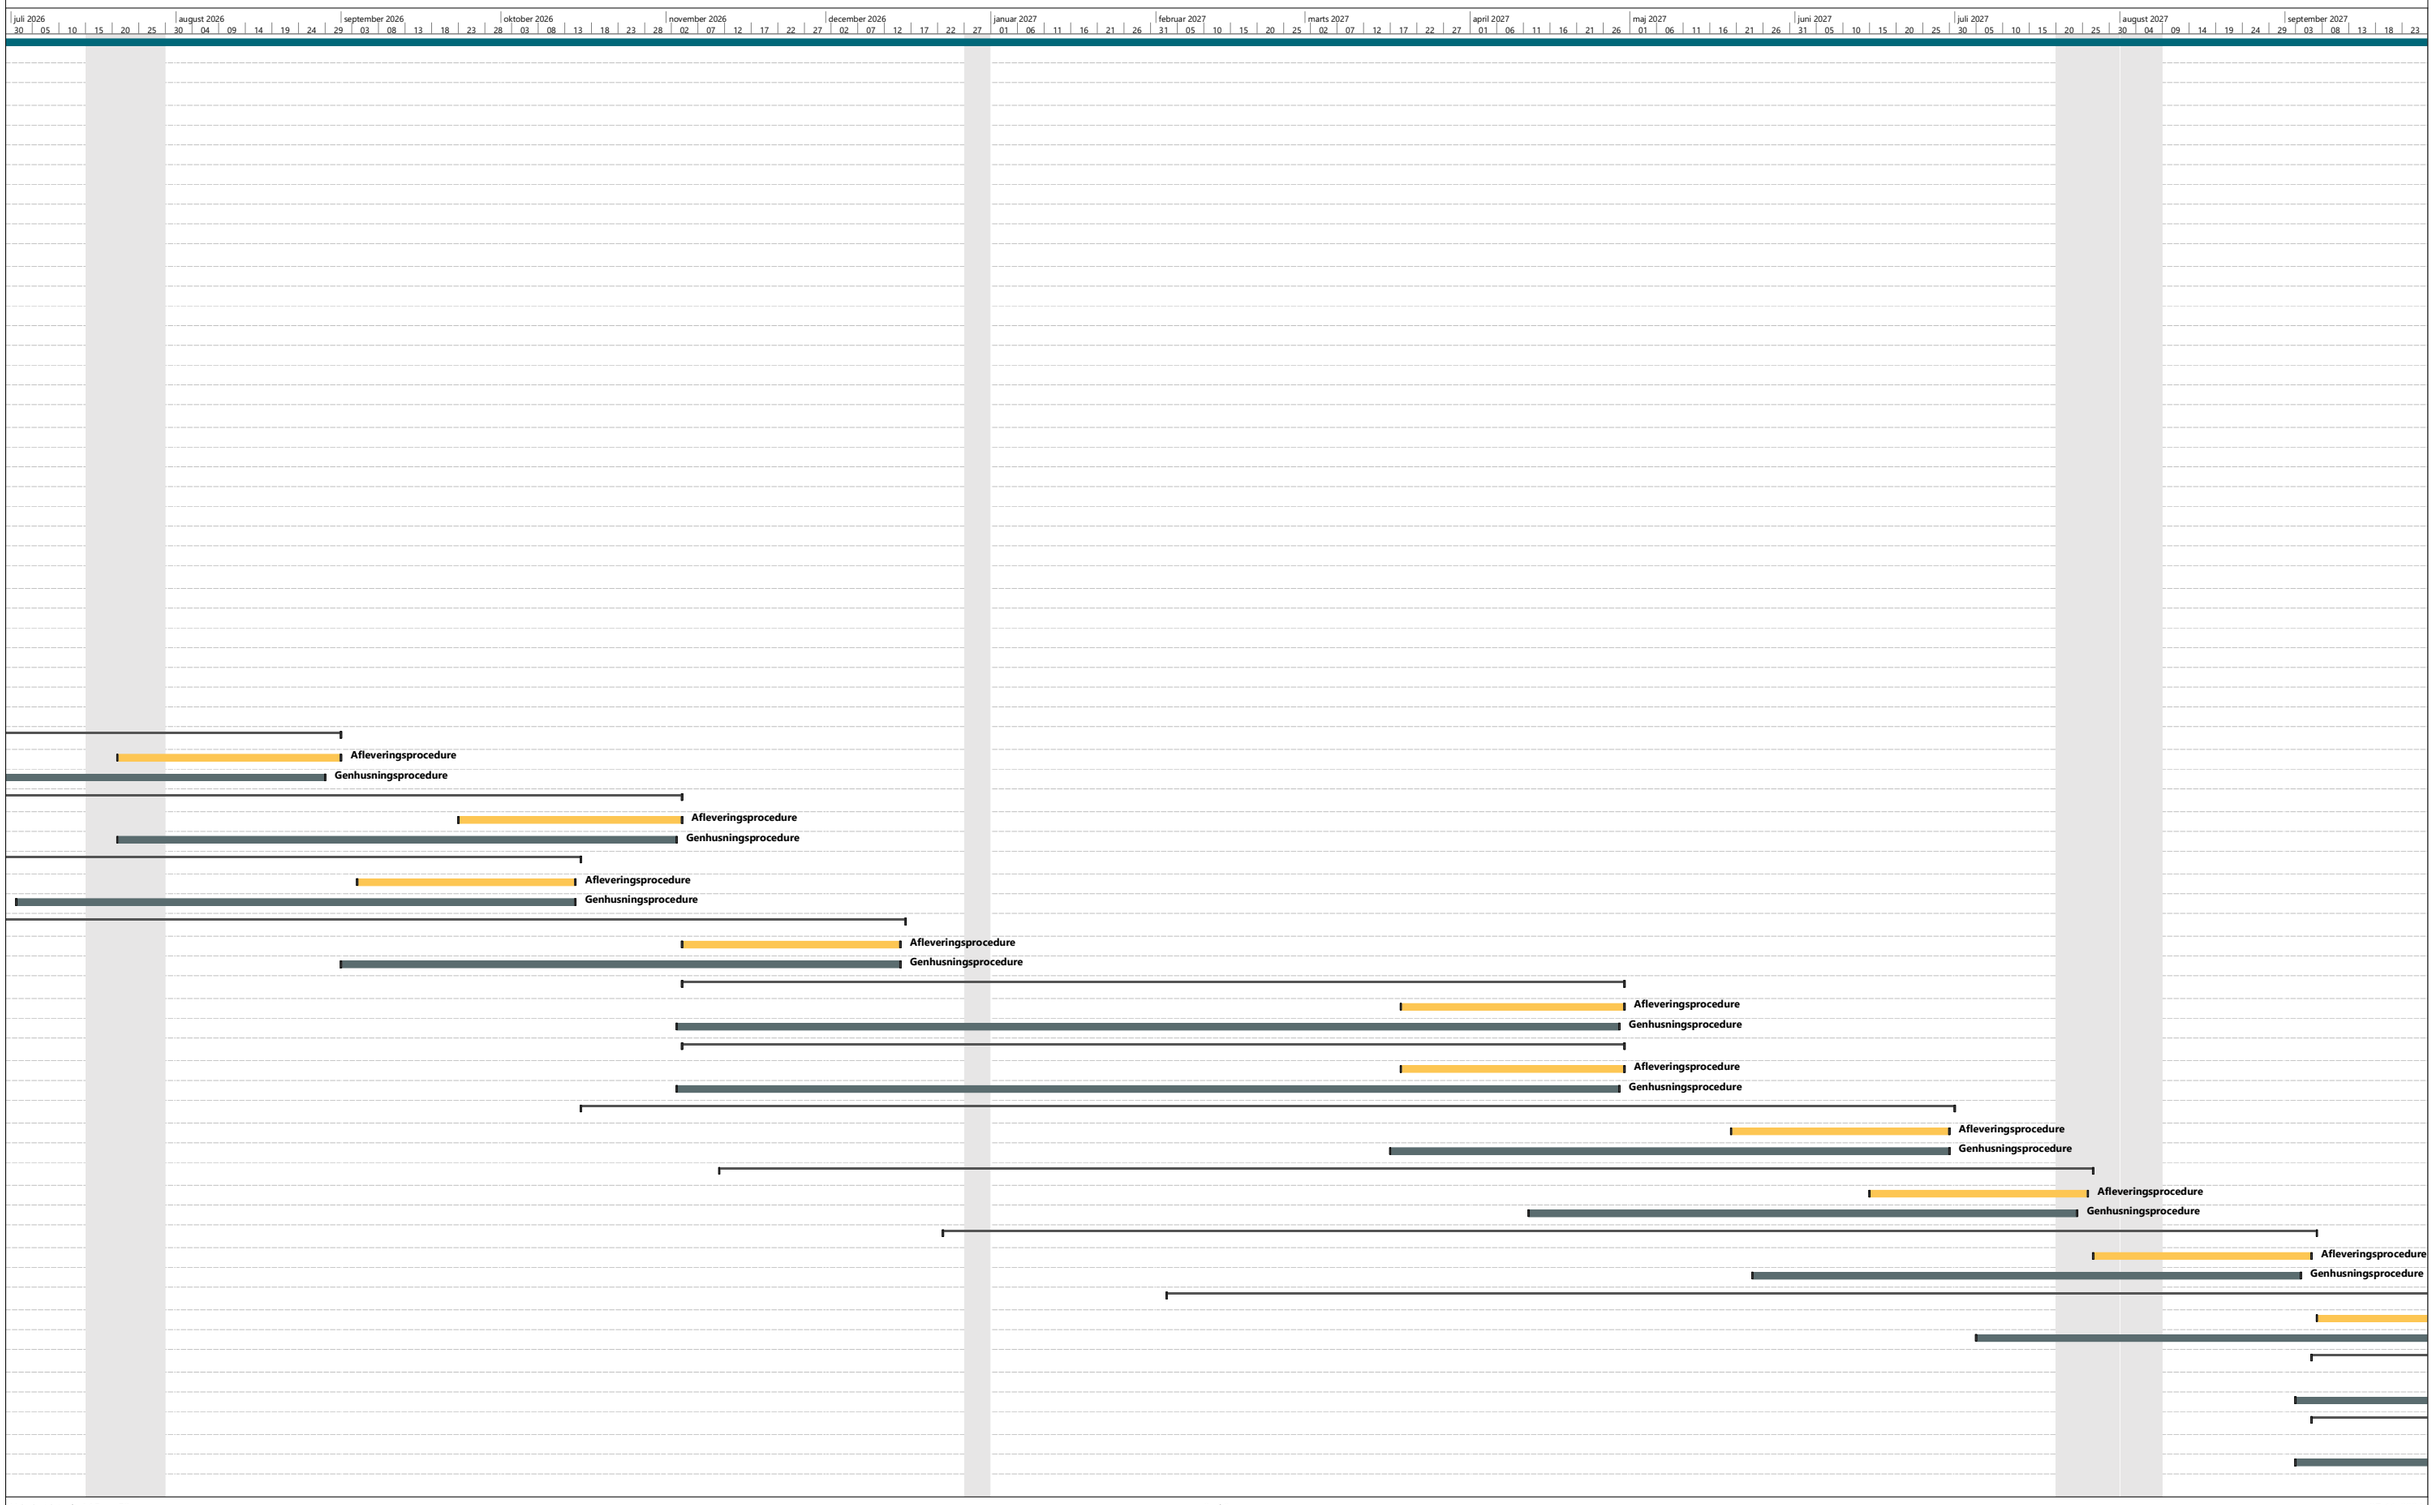
Fysisk udprintsstørrelse: A3
Bilag 2
